

# 110學年度(下)期末校務會議 總務處報告



總務主任：張亦妤

111年6月30日



新 北 市 立 文 山 國 民 中 學  
New Taipei Municipal Wenshan Junior High School



感謝大家三年來對總務處  
的協助與支持




# 111年度重大工程案

## 文山國中111年度校舍重大工程預定進度表

工程名稱	111年 5月	111年 6月	111年 7月	111年 8月	111年 9月	111年 10月	111年 11月
工家大樓使照申請案	案已於110年7/5發包 消防及無障礙設施改善經費業已執行	消防圖說審查及無障礙設施缺失改善作業	俟教育局核定無障礙設施改善內容	申請使照作業並取得執照			
教室置物櫃及課桌椅	教室課桌椅更換作業	教室課桌椅驗收	教室置物櫃工程發包作業	教室置物櫃工程施作	教室置物櫃工程竣工及驗收		
職務宿舍拆棄案	委托規劃設計	委托規劃作業	工程發包作業	工程施作	工程竣工		
綜合大樓廁所改建案	俟教育局核定工程經費			工程發包前置作業	工程發包作業	工程施作	工程施作
校園監視器系統改善	設備經費評估前置作業	設備經費評估前置作業	經費申請作業	教育局核定工程經費	工程發包作業	工程施作	工程竣工

# 文山國中職務宿舍拆除位置圖

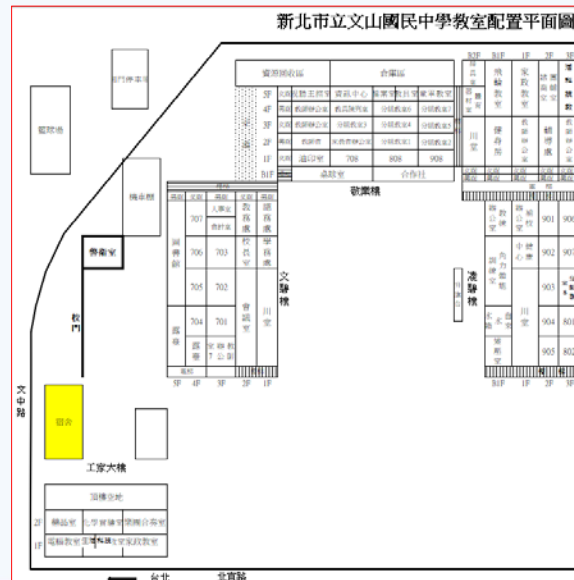

## 現況照片

正面照



高處側面照



側面照

高處正面照




## 增設非營利幼兒園規劃工程進度表


工程規劃預計進度	111年 5月	111年 6月	111年 7月	111年 8月	111年 9月	111年 10月	111年 11月	111年 12月
教室遷移安置工程	教室整修安置 工程 已竣工驗收	工程驗收 及結算						
非營利幼兒園 設置工程	細部規劃設計 工程發包前置 作業	核定工程及設 備經費	招標及工程 發包作業	工程發包 執行	工程發包 執行	工程發包 執行/ 驗收及結算		

## 非營利幼兒園規劃設計模擬圖





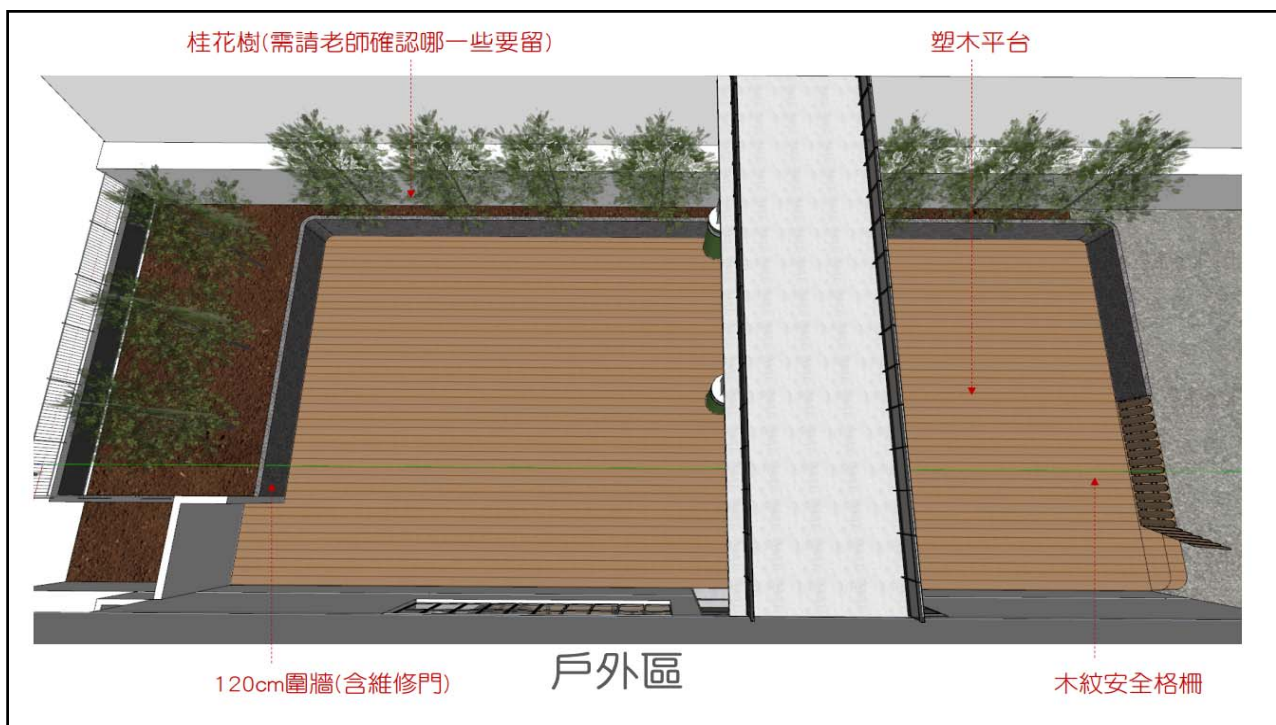

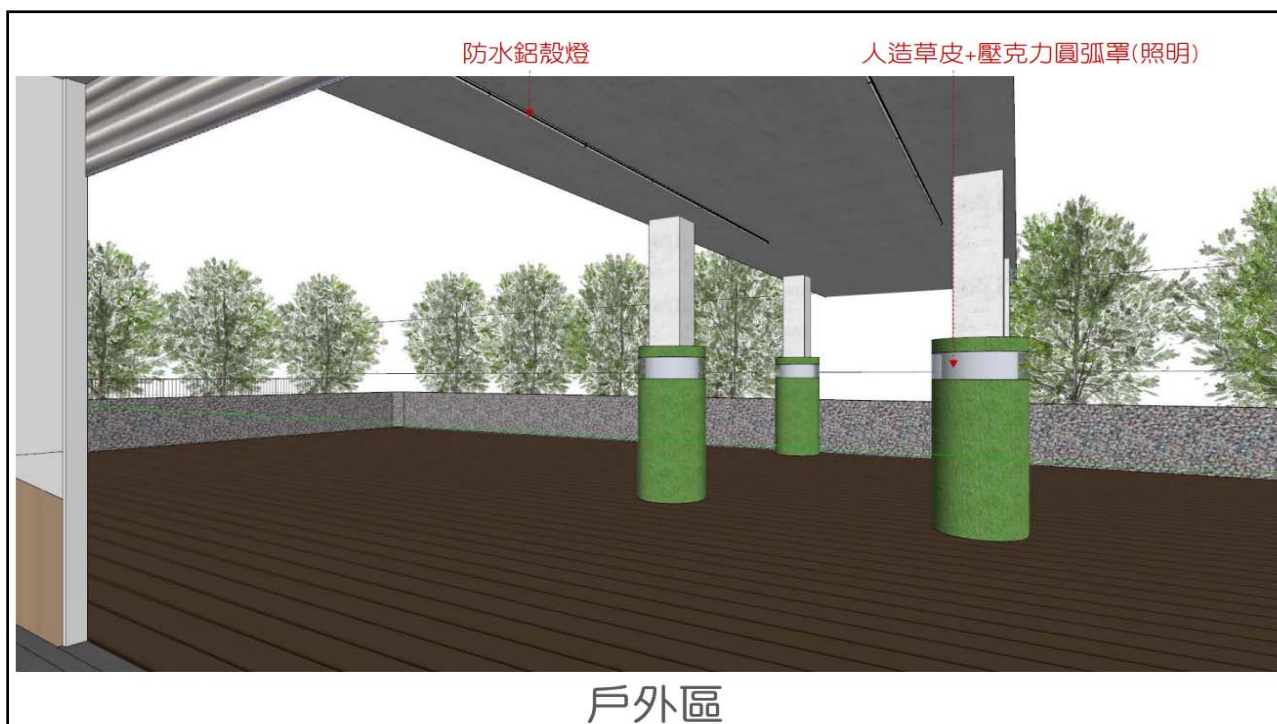



## 校舍修繕案



◆110學年度(下)校舍修建案頗多，感謝全體師生包容施工過程之暫有不便及未盡通知事宜，讓幸福文中有更好的校園學習環境。





